


№	Наименование	Дни	Начало	Край	Греховен мрежови график за изпълнение на СМР																							
					Jun '17	Jul '17	Aug '17	Sep '17	Oct '17																			
1	Административна сграда гр.Велинград, - УПИ XXIV - за административна дейност, имот 3065, кв. № 124 по РП на гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №16	127 days	Mon 05.06.17	Mon 09.10.17	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	
2	Начало	0 days	Mon 05.06.17	Mon 05.06.17	05.06																							
3	ВИСОКО ЧЕТИРИЕТАЖНО ТЯЛО - Сграда идентификатор - 501.3065.1	120 days	Mon 05.06.17	Mon 02.10.17	[Task bar]																							
4	ЕТАЖ-КОТА - ±1.36; ±0.00	31 days	Thu 08.06.17	Sat 08.07.17	[Task bar]																							
5	ЧАСТ АС	19 days	Tue 20.06.17	Sat 08.07.17	[Task bar]																							
6	Демонтаж монтаж дограма	5 days	Tue 20.06.17	Sat 24.06.17	[Task bar]																							
7	Довършителни СМР	7 days	Sun 25.06.17	Sat 01.07.17	[Task bar]																							
8	Топлоизолация на сгради външно по стени	15 days	Sat 24.06.17	Sat 08.07.17	[Task bar]																							
9	ЧАСТ Вик	6 days	Thu 08.06.17	Tue 13.06.17	[Task bar]																							
10	Строителни монтажни работи	6 days	Thu 08.06.17	Tue 13.06.17	[Task bar]																							
11	ЧАСТ ЕЛ	7 days	Thu 08.06.17	Wed 14.06.17	[Task bar]																							
12	СИЛНОТОКОВИ ИНСТРАЛАЦИИ	5 days	Thu 08.06.17	Mon 12.06.17	[Task bar]																							
13	Строителни монтажни работи	5 days	Thu 08.06.17	Mon 12.06.17	[Task bar]																							
14	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	7 days	Thu 08.06.17	Wed 14.06.17	[Task bar]																							
15	Строителни монтажни работи	7 days	Thu 08.06.17	Wed 14.06.17	[Task bar]																							
16	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ	3 days	Thu 08.06.17	Sat 10.06.17	[Task bar]																							
17	Строителни монтажни работи	3 days	Thu 08.06.17	Sat 10.06.17	[Task bar]																							
18	ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ	7 days	Sun 18.06.17	Sat 24.06.17	[Task bar]																							
19	Строителни монтажни работи	7 days	Sun 18.06.17	Sat 24.06.17	[Task bar]																							
20	ЕТАЖ-КОТА - +3.80	30 days	Sun 09.07.17	Mon 07.08.17	[Task bar]																							
21	СМР	30 days	Sun 09.07.17	Mon 07.08.17	[Task bar]																							
22	ЕТАЖ-КОТА - +7.25	35 days	Thu 27.07.17	Wed 30.08.17	[Task bar]																							
23	СМР	35 days	Thu 27.07.17	Wed 30.08.17	[Task bar]																							
24	ЕТАЖ-КОТА - +10.70	35 days	Fri 18.08.17	Thu 21.09.17	[Task bar]																							
25	СМР	35 days	Fri 18.08.17	Thu 21.09.17	[Task bar]																							
26	ЕТАЖ-КОТА - +15.68	12 days	Thu 08.06.17	Mon 19.06.17	[Task bar]																							
27	СМР- Покрив	12 days	Thu 08.06.17	Mon 19.06.17	[Task bar]																							
28	ЕТАЖ-КОТА - +16.60	3 days	Mon 05.06.17	Wed 07.06.17	[Task bar]																							
29	СМР - Покрив шахта асансьорна	3 days	Mon 05.06.17	Wed 07.06.17	[Task bar]																							
30	ЧАСТ КИП и А	8 days	Tue 13.06.17	Tue 20.06.17	[Task bar]																							
31	Доставка VRF система за централна климатизация	5 days	Tue 13.06.17	Sat 17.06.17	[Task bar]																							
32	Монтаж КИП иА на VRF система за централна климатизация	3 days	Sun 18.06.17	Tue 20.06.17	[Task bar]																							
33	Наладка, съставяне на протоколи и становища за лабораторни изпитвания, замервания и др.	4 days	Fri 22.09.17	Mon 25.09.17	[Task bar]																							
34	Предаване на строежа	7 days	Tue 26.09.17	Mon 02.10.17	[Task bar]																							
35	НИСКОЕТАЖНО ТЯЛО Сграда идентификатор - 501.3065.2	66 days	Mon 05.06.17	Wed 09.08.17	[Task bar]																							
36	ЕТАЖ Кота - ±1.45	18 days	Sat 24.06.17	Tue 11.07.17	[Task bar]																							
37	Демонтаж монтаж дограма	5 days	Sat 24.06.17	Wed 28.06.17	[Task bar]																							
38	Довършителни СМР	7 days	Wed 05.07.17	Tue 11.07.17	[Task bar]																							
39	Топлоизолация на сгради външно по стени	15 days	Tue 27.06.17	Tue 11.07.17	[Task bar]																							
40	ЕТАЖ Кота - +1.23	18 days	Sun 09.07.17	Wed 26.07.17	[Task bar]																							

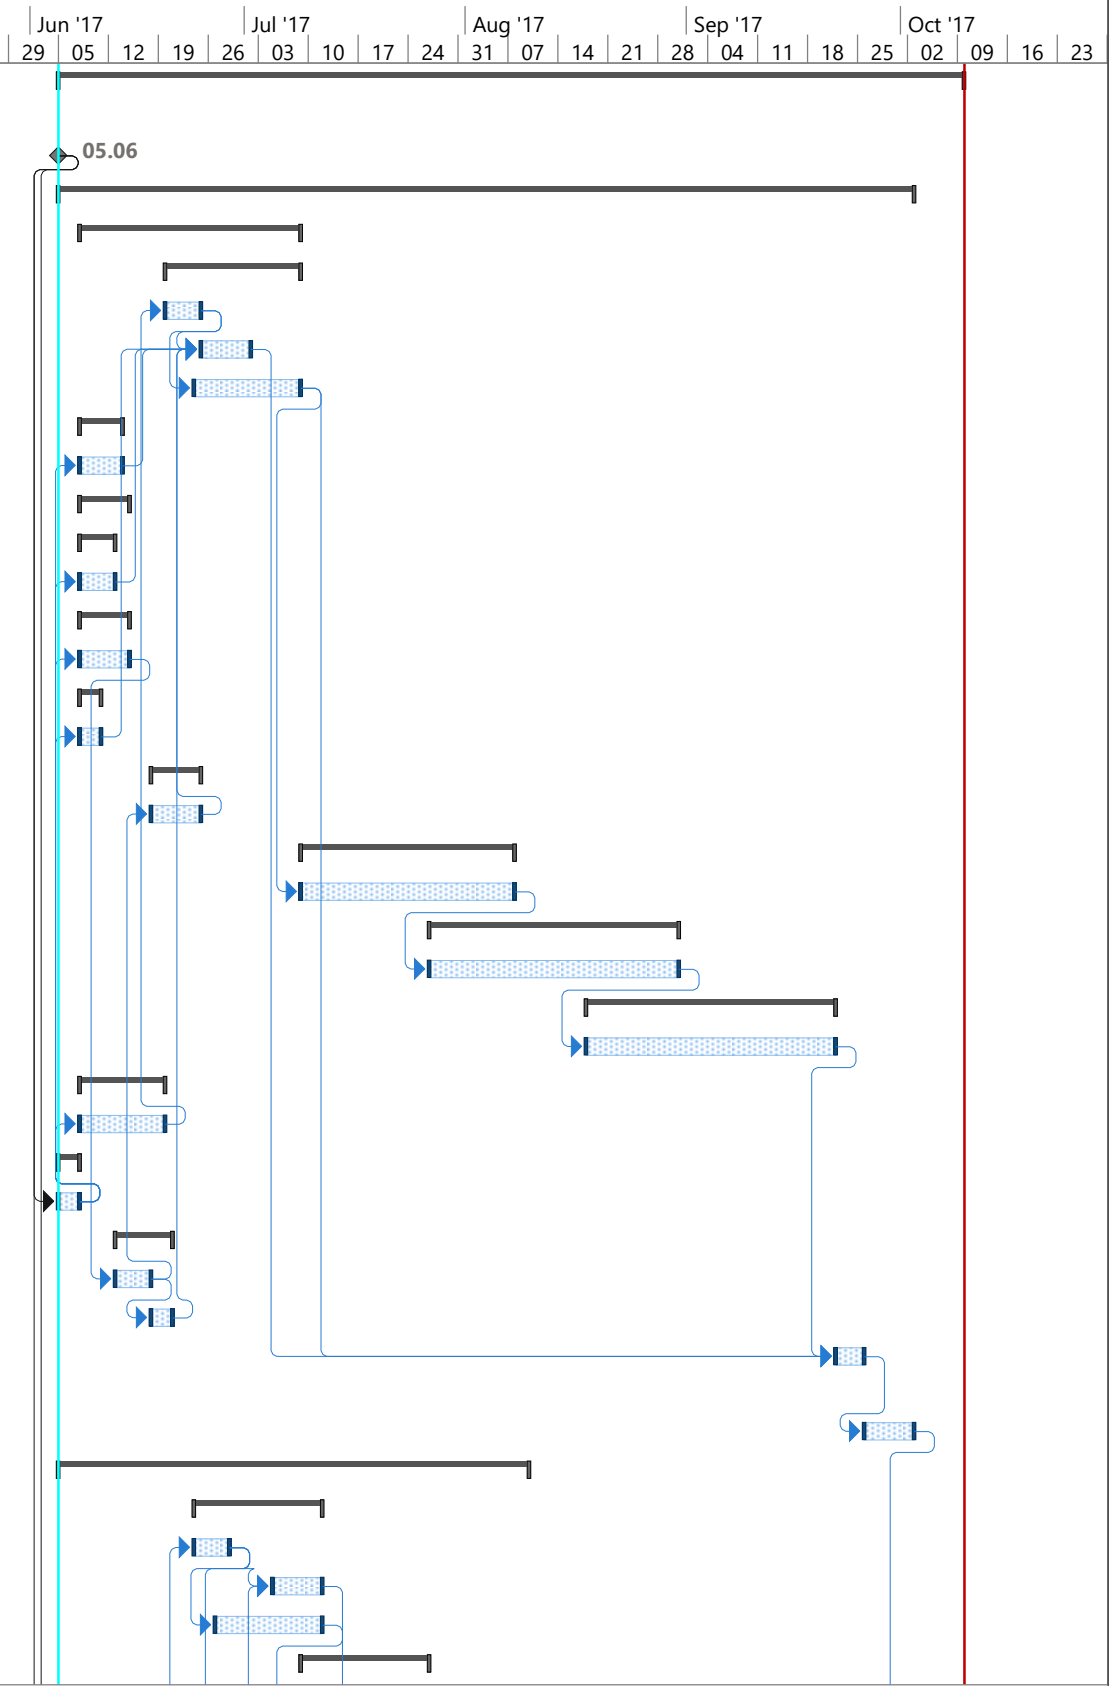

№	Наименование	Дни	Начало	Край	Timeline (Jun '17 to Oct '17)																											
					22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23					
41	СМР	18 days	Sun 09.07.17	Wed 26.07.17	[Task bar]																											
42	ЕТАЖ Кота - +4.88	46 days	Wed 14.06.17	Sat 29.07.17	[Task bar]																											
43	СМР - Покрив -хидроизолация	12 days	Wed 14.06.17	Sun 25.06.17	[Task bar]																											
44	Топлоизолация на сгради външно по стени	4 days	Wed 26.07.17	Sat 29.07.17	[Task bar]																											
45	ЕТАЖ Кота - +6.58	59 days	Mon 05.06.17	Wed 02.08.17	[Task bar]																											
46	СМР - Покрив -хидроизолация	5 days	Mon 05.06.17	Fri 09.06.17	[Task bar]																											
47	Топлоизолация на сгради външно по стени	4 days	Sun 30.07.17	Wed 02.08.17	[Task bar]																											
48	Доставка VRF система за централна климатизация	5 days	Tue 06.06.17	Sat 10.06.17	[Task bar]																											
49	Монтаж външни тяло наVRF система за централна климатизация	3 days	Sun 11.06.17	Tue 13.06.17	[Task bar]																											
50	Монтаж на VRF система за централна климатизация	6 days	Thu 29.06.17	Tue 04.07.17	[Task bar]																											
51	Наладка, съставяне на протоколи и становища за лабораторни изпитвания, замервания и др.	3 days	Thu 03.08.17	Sat 05.08.17	[Task bar]																											
52	Предаване на строежа	4 days	Sun 06.08.17	Wed 09.08.17	[Task bar]																											
53	Въвеждане в експлоатация	7 days	Tue 03.10.17	Mon 09.10.17	[Task bar]																											
54	Край	0 days	Mon 09.10.17	Mon 09.10.17	[Task bar]																											
