№	ШИФЪР	Видове СМР	Ед.м	Кол-во	норма време ч.ч.	трудоем кост ч.дни	бр.работници	състав на звеното по специалности	машиноем кост мсм	основна механизация	машиносмени	бр.основ.машини	продължителност в кал. дни
		Откриване на стр.площадка с акт обр.2	бр	1.00									1
		МОБИЛИЗАЦИЯ	бр	1.00	160	20.00	10	общи работници					2
№		**ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА**											
107	8102281111	Доставка и полагане на каменна вата 15см, с плътност ≤ 150кг/м3, якост на натиск мин. 70kPa, λ ≤ 0.039 W/mK	м2	677.00	0.41	34.70	6	работник топлоизолации-3 общ работник-3					6
108	8102281213	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	781.00	0.27	26.38	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3					4
109	8102280810	Битумен грунд	м2	781.00	0.06	5.86	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3					1
110	8102077001кор от м3	Лек бетон за наклон – мин. 5 см	м2	677.00	0.02	1.69	2	бетонджия-1 общ работник-1		БЕТОНПОМПА			1
111	8102281111	Топлоизолация 5см по борд каменна вата	м2	105.20	0.41	5.39	6	работник топлоизолации-3 общ работник-3					1
112	собств анализ	EPDM лента при фуги	м	41.60	0.4	2.08	2	работник хидроизолации-1 общ работник-1					1
113	8415650000	Ламаринена шапка по борд	м	112.20	1.29	18.09	6	тенекеджия-3 общ работник-3					3
114	8415650000	Шапки върху колонки	бр	14.00	1.29	2.26	3	общ работник-3					1
		Тяло 1Б (доставка и труд)											
115	8102281310	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	183.00	0.26	5.95	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3					1
116	8102281310	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	183.00	0.26	5.95	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3		ГАЗОВА ГОРЕЛКА			1
117	8102280810	Битумен грунд	м2	183.00	0.06	1.37	1	работник хидроизолации-1					1
118	8415190122	Армирана циментова замазка 3 см	м2	136.60	0.74	12.64	6	замаскаджия-3 общ работник-3					2
119	8102281213	Полиетиленово фолио 100 микрона	м2	136.60	0.12	2.05	2	работник хидроизолации-1 общ работник-1					1
120	8102281111	Доставка и лепене на топлоизолационни плоскости ПИР 8см (тегло макс. 38кг/м3, клас по реакция на огън С)	м2	136.60	0.41	7.00	4	работник топлоизолации-2 общ работник-2					2
121	8102281213	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	183.00	0.27	6.18	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3					1
[illegible]	8102280810	Битумен грунд	м2	183.00	0.06	1.37	2	работник хидроизолации-1 общ работник-1					1
[illegible]	8102077001кор от м3	Лек бетон за наклон – 5-20см	м2	136.60	0.02	0.34	1	бетонджия-1		БЕТОНПОМПА			1
124	8102280015	Направа холкери 10-15 мм	м	47.30	0.38	2.25	1	работник настилки и облицовки-1					2
125	8102281102кор	Топлоизолация 5 см по борд	м2	87.75	1.26	13.82	6	работник топлоизолации-3 общ работник-3					2
126	СЕК 10 058	Борд - обработка – цим. шпакловка	м2	78.00	0.49	4.78	3	шпакловчик-2 общ работник-1					2
127	СЕК 10 124	Борд - обработка – мазилка светла дребнозърнеска	м2	52.00	0.96	6.24	6	мазач-3 общ работник-3					1
128	8415650000	Ламаринена шапка по борд (по детайл)	м	47.30	1.29	7.63	4	тенекеджия-2 общ работник-2					2
		Тяло 2 (доставка и труд)											
129	собств анализ	Доставка и монтаж на декинг от WPC, вкл. подконструкция и т.н.	м2	420.00	1.2	63.00	6	работник настилки и облицовки-3 общ работник-3					11
130	8102281310	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	483.00	0.26	15.70	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3					3
131	8102281310	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	483.00	0.26	15.70	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3		ГАЗОВА ГОРЕЛКА			3
132	8102280810	Битумен грунд	м2	483.00	0.06	3.62	3	работник хидроизолации-2 общ работник-1					1
133	8415190122	Армирана циментова замазка 4 см	м2	420.00	0.74	38.85	6	бетонджия-3 общ работник-3					6
134	8102281213	Полиетиленово фолио 100 микрона	м2	420.00	0.12	6.30	3	работник хидроизолации-2 общ работник-1					2
135	8102281111	Доставка и лепене на топлоизолационни плоскости ПИР 8см (тегло макс. 38кг/м3, клас по реакция на огън С)	м2	420.00	0.41	21.53	6	работник топлоизолации-3 общ работник-3					4
136	8102281213	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	483.00	0.27	16.30	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3					3
137	8102280810	Битумен грунд	м2	483.00	0.06	3.62	4	работник хидроизолации-2 общ работник-2					1
138	8102077001кор от м3	Лек бетон за наклон – мин. 5 см	м2	420.00	0.02	1.05	1	бетонджия-1		БЕТОНПОМПА			1
[illegible]	8102280015	Направа холкери 10-15 мм	м	95.30	0.38	4.53	1	работник настилки и облицовки-1					5
	8247632220	Барбакан	бр	6.00	1.71	1.28	2	тенекеджия-2					1
141	8102281111	Топлоизолация 5 см по борд	м2	52.50	0.41	2.69	3	работник топлоизолации-2 общ работник-1					1
142	СЕК 10 058	Борд - обработка – цим. шпакловка	м2	32.00	0.49	1.96	2	шпакловчик-1 общ работник-1					1
143	8102122326	Каменна шапка по борд	м	97.00	1.08	13.10	6	работник облицовки-3 общ работник-3					2
144	8311143801	Парапет по детайл с бар плот	м	36.20	1.67	7.56	4	железар-2 общ работник-2					2
		Тяло 3 (доставка и труд)											
145	8102281310	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	226.00	0.26	7.35	6	работник хидроизолации-3 общ работник-3					1
146	8102281310	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана с интегрирани пародренажни ивици	м2	226.00	0.26	7.35	7	работник хидроизолации-4 общ работник-3		ГАЗОВА ГОРЕЛКА			1
147	8102280810	Битумен грунд	м2	226.00	0.06	1.70	2	работник хидроизолации–1 общ работник-1					1
148	8415190122	Армирана циментова замазка 3 см	м2	177.00	0.74	16.37	6	работник настилки-3 общ работник-3					3
149	8102281213	Полиетиленово фолио 100 микрона	м2	177.00	0.12	2.66	3	работник хидроизолации-2 общ работник-1					1
150	8102281111	Доставка и лепене на топлоизолационни плоскости ПИР 8см (тегло макс. 38кг/м3, клас по реакция на огън С)	м2	177.00	0.41	9.07	5	работник топлоизолации-3 общ работник-2					2
151	8102281213	Доставка и полагане на битумна пароизолация с алуминиева вложка	м2	226.00	0.26	7.35	7	работник хидроизолации-4 общ работник-3					1
152	8102280810	Битумен грунд	м2	226.00	0.06	1.70	2	работник хидроизолации-1 общ работник-1					1
153	8102077001кор от м3	Лек бетон за наклон - мин.5 см	м2	177.00	0.02	0.44	1	бетонджия-1		БЕТОНПОМПА			1
154	8102280015	Направа холкери 10-15 мм	м	54.20	0.38	2.57	1	работник настилки и облицовки-1					3
155	8102281111	Топлоизолация 5 см по борд	м2	38.00	0.41	1.95	2	работник топлоизолации-1 общ работник-1					1
156	СЕК 10 124	Борд - обработка – мазилка светла дребнозърнеска	м2	54.20	0.96	6.50	6	мазач-3 общ работник-3					1
157	СЕК 10 058	Борд - обработка – цим. Шпакловка	м2	79.20	0.49	4.85	4	шпакловчик-2 общ работник-2					1
158	8415650000	Ламаринена шапка по борд (по детайл)	м	54.20	1.29	8.74	4	тенекеджия-2 общ работник-2					2
		Тераси на кота +3.40 (тяло 1Б) (доставка и труд)											
159	СЕК 11 073	Гранитогрес – противохлъзгав, студоустойчив, цвят – бетон – доставка и лепене	м2	65.30	2.02	16.49	6	работник настилки и облицовки-3 общ работник-3					3
160	8102281310	Доставка и полагане на битумна хидроизолация SBS с посипка, вкл. Всички аксесоари и фасонни части	м2	97.50	0.26	3.17	3	работник хидроизолации-2 общ работник-1					1

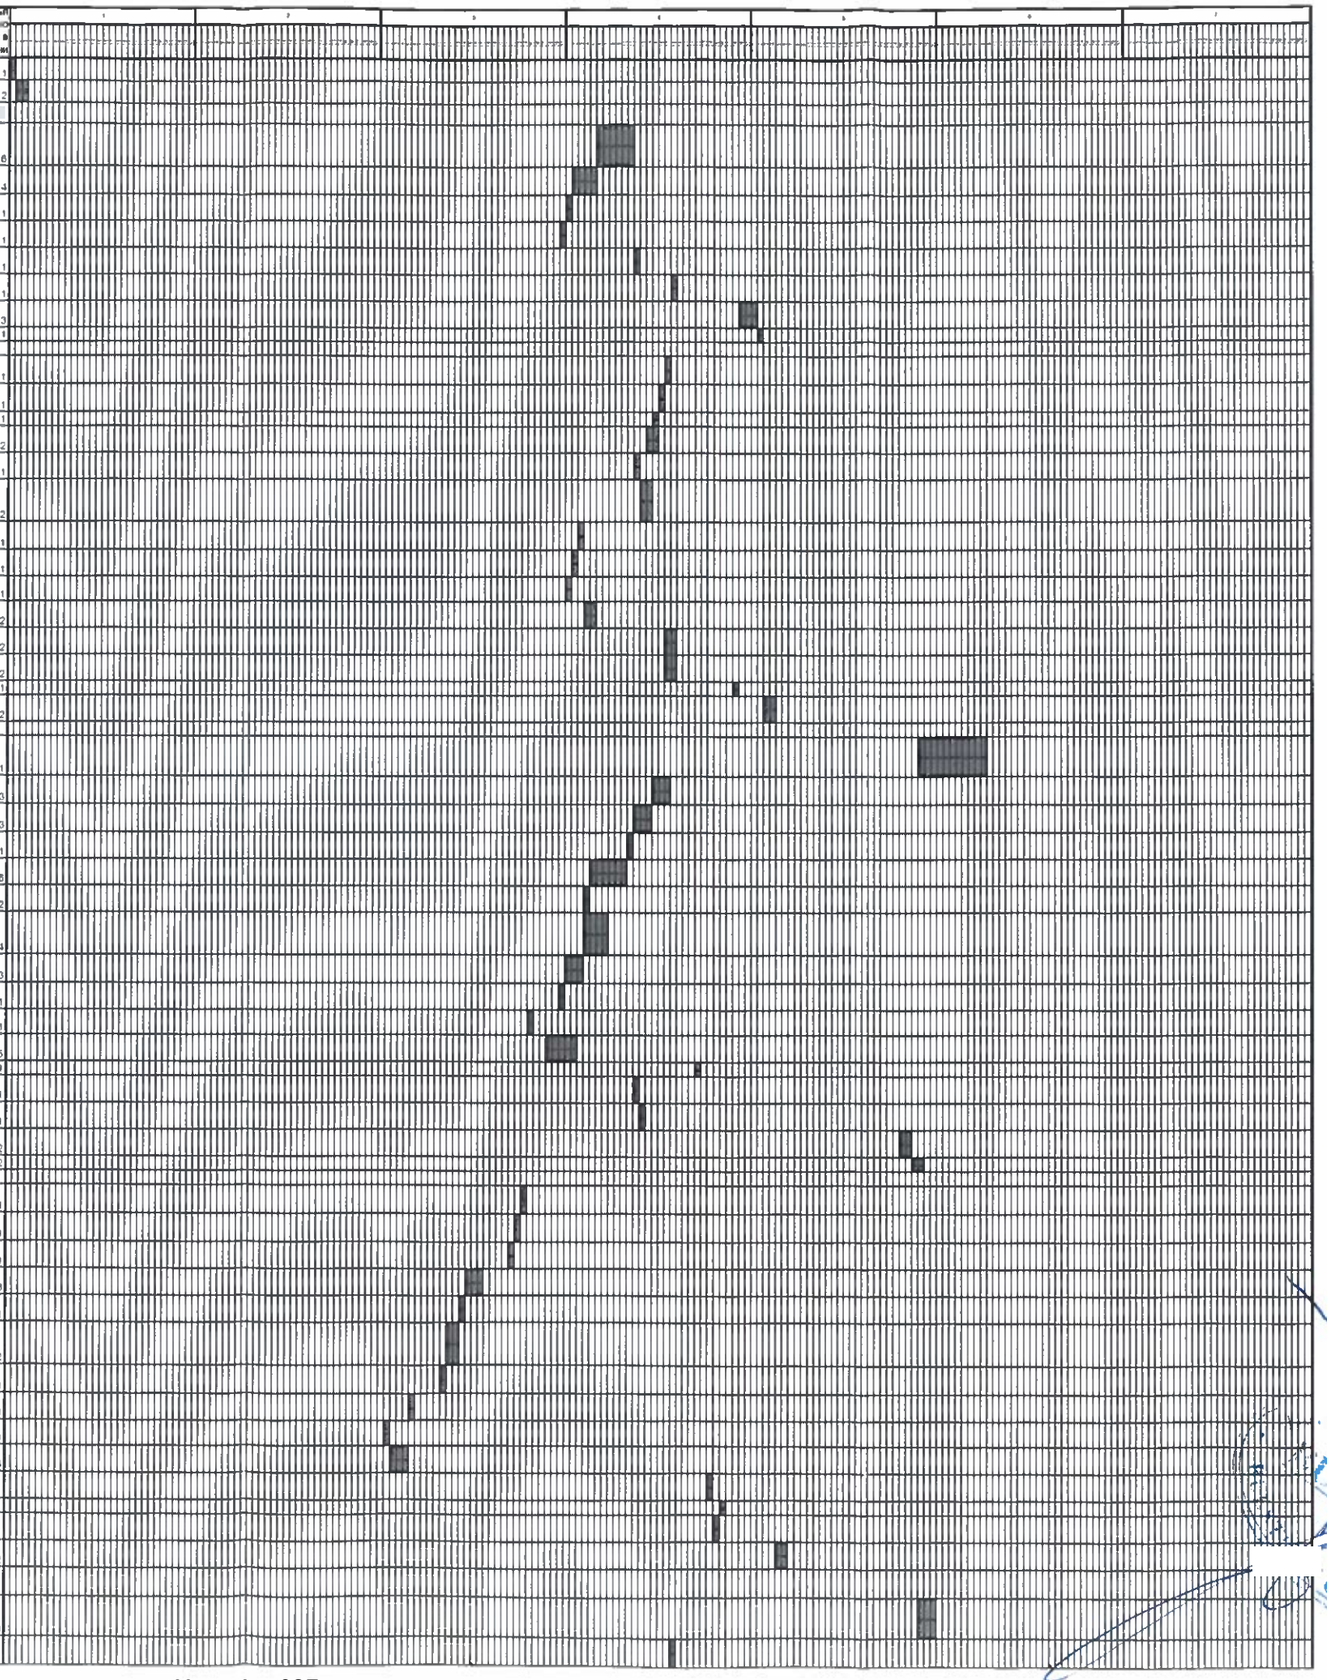

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП
