N	ШИФЪР	Видове СМР	ЕД.М	Кол-во	норма време, ч.ч.	трудоем кост ч.дни	бр.ра ботни ци	състав на звеното по специалности	машинем кост мсм	основна механизация	машин носме ни	бр.ос н.ма шини	продъл жително ст в кал. дни
		Откриване на стр.площадка с акт обр.2	бр	1.00									1
		МОБИЛИЗАЦИЯ	бр	1.00	160	20.00	10	общи работници					2
No		ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА											
27	8102413071 кор	Доставка и полагане на Еластична пожарозащитна пяна по фуги	бр	50.00	0.85	5.31	6	работник изолации-3 общ работник-3		ръчни инструменти			1
28	8102413071 кор	Доставка и монтаж на Конструкция за облицовки (перфорирана ламарина и акустични пана по стени на зала 1), с профили за гипсокартон, вкл. Боядисване с черно по челните части зад перф. ламарина	м2	237.00	0.85	25.18	6	монтажник метална конструкция-3 общ работник-3		ръчни инструменти			4
29	8415730000	Доставка и монтаж на облицовка от перфорирана ламарина 1.5 мм - черна стоманена прахово боядисана в цвят по RAL, отвори ф4 мм, разст. 6 мм или подобна – за залата	м2	78.00	1.1	10.73	6	монтажник метална конструкция-3 общ работник-3		ръчни инструменти			2
30	8261143003	Доставка и полагане на Минерална вата 10 см, 70 кг/м3 (зад перфорирана ламарина), с черен стъклотекстилен воал	м2	78.00	0.32	3.12	2	работник сухо строителство-2		ръчни инструменти			2
31	8102413074	Обличане на вертикални шахтове с гипсокартон и вата	м2	27.00	1.61	5.43	6	работник сухо строителство-3 общ работник-3		ръчни инструменти			1
32	8261143003	Доставка и полагане на Мин. Вата при фуги и зад акуст. Плоскости зала, 5см 32кг/м3	м2	296.00	0.32	11.84	4	работник сухо строителство-2 общ работник-2		ръчни инструменти			3
33	8261143003	Доставка и полагане на Мин. Вата при фуги, 10см 32кг/м3	м2	34.00	0.32	1.36	2	работник сухо строителство-1 общ работник-1		ръчни инструменти			1
34	собств анализ	Изработка и монтаж на пана (над врати) от МДФ, боядисан по RAL	м2	2.50	0.85	0.27	1	дърводелец-1		ръчни инструменти			1
35	8102413203	Доставка и монтаж на Растерен звукопоглъщащ окачен таван с акустични пана 60/60см – клас А	м2	34.00	1.34	5.70	6	работник сухо строителство-3 общ работник-3		ръчни инструменти			1
36	8102413203	Доставка и монтаж на Растерен окачен таван с минералватови пана 120/60см, в цвят черно	м2	12.24	1.34	2.05	2	работник сухо строителство-1 общ работник-1		ръчни инструменти			1
37	8102413203	Доставка и монтаж на Растерен окачен таван с минералватови пана 60/60см	м2	7.00	1.34	1.17							
38	8102413280 кор	Доставка и монтаж на Окачен таван от гипсокартон (свободно премостващ) и мин. Вата 5см	м2	5.20	1.6	1.04	2	работник сухо строителство-1 общ работник-1		ръчни инструменти			1
	8102413074 кор	Изработка на Куфари от гипсокартон	м2	65.10	1.8	14.65	6	работник сухо строителство-3 общ работник-3		ръчни инструменти			2
40	8102413280 кор	Доставка и монтаж на Окачен таван от гипсокартон с мин. Вата 5см	м2	341.40	1.6	68.28	12	работник сухо строителство-6 общ работник-6		ръчни инструменти			6
41	8102413280 кор	Доставка и монтаж на Окачен таван от перфориран гипсокартон (крилци отвори), вкл.вата 10 см	м2	12.20	1.6	2.44	2	работник сухо строителство-1 общ работник-1		ръчни инструменти			1
42	8102413280 кор	Доставка и монтаж на Окачени пана от перфориран гипсокартон (крилци отвори) 180/180см, вкл.вата 10 см	бр	18.00	1.6	3.60	4	работник сухо строителство-2 общ работник-2		ръчни инструменти			1
43	8211491100	Ревизионни капаци 20/20см, във окачени тавани	бр	13.00	0.16	0.26	1	общ работник-1		ръчни инструменти			1
44	8102413074 кор	Изработка на Куфари от влагоустойчив гипсокартон	м2	4.00	1.8	0.90	1	работник сухо строителство-1		ръчни инструменти			1
45	8102413280 кор	Доставка и монтаж на Окачен таван с влагоустойчив гипсокартон (свободно премостващ)	м2	12.80	1.6	2.56		работник сухо строителство-4 общ работник-4		ръчни инструменти			
46	8102413280 кор	Доставка и монтаж на Окачен таван с влагоустойчив гипсокартон - WC, бани, мокри помещения	м2	27.30	1.6	5.46	8						1
47	8102413280 кор	Доставка и монтаж на Филцов линеен окачен таван, вкл. Конструкция; ламели 40/55мм, фуга 80мм, цвят по каталог	м2	135.20	1.6	27.04	12	работник сухо строителство-6 общ работник-6		ръчни инструменти			2
IV		БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ – цветове по каталог след избор на проектанта											
48	8418570000	Боядисване с бяла латексова боя върху тавани , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	273.84	0.35	11.98	6	бояджия-3 общ работник-3		ръчни инструменти			2
49	8418570000	Боядисване с тъмна латексова боя (цвят по каталог) върху окачени тавани , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	178.00	0.35	7.79	8	бояджия-4 общ работник-4		ръчни инструменти			1
50	8418570000	Боядисване с тъмна латексова боя (цвят по каталог) върху окачени тавани от перфорирани гипсокартон , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	71.60	0.35	3.13	2	бояджия-1 общ работник-1		ръчни инструменти			2
51	8418570000	Боядисване с тъмна латексова боя (цвят по каталог) върху тавани - стоманобетон , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	1 510.00	0.35	66.06	6	бояджия-3 общ работник-3					11
52	собств анализ	Обезпрашаване на таван - видим бетон	м2	831.00	0.36	37.40	6	общ работник-6					6
53	8418570000	Боядисване с бяла латексова боя върху окачени тавани , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване - **бани, WC**	м2	27.30	0.35	1.19	1	бояджия-1					1
54	8418570000	Боядисване с черна латексова боя върху окачени тавани , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване - **бани, WC**	м2	16.80	0.35	0.74	1	бояджия-1					1
55	8418570000	Боядисване с **бяла** латексова боя над облицовка от фаянс , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване - **бани, WCБ**	м2	99.00	0.35	4.33	2	бояджия-1 общ работник-1					2
56	8418570000	Боядисване с **черна** латексова боя над облицовка от фаянс , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване - **бани, WC**	м2	35.00	0.35	1.53	2	бояджия-1 общ работник-1					1
57	8102162181	Боядисване с пожарозащитна боя по метална конструкция, включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване - прогнозна стойност (ще бъде проектирана на база на конкретна марка боя, избрана съвместно със строители и по предписания в проект по част ПБ) - черен цвят (по RAL)	бр	1.00	192	24.00	6	бояджия-3 общ работник-3					4
58	8418570000	Боядисване с бяла латексова боя върху стени , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	1 045.90	0.35	85.13	6	бояджия-3 общ работник-3					14
59	8418570000	Боядисване с тъмна латексова боя (цвят по каталог) върху стени , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	421.50	0.35	18.44	6	бояджия-3 общ работник-3					3
60	8418570000	Боядисване с латексова боя - наситен цвят върху стени , включително предбояджийска подготовка, боя, консумативи, защита и почистване, до пълно покриване	м2	39.40	0.35	1.72	2	бояджия-1 общ работник-1					1

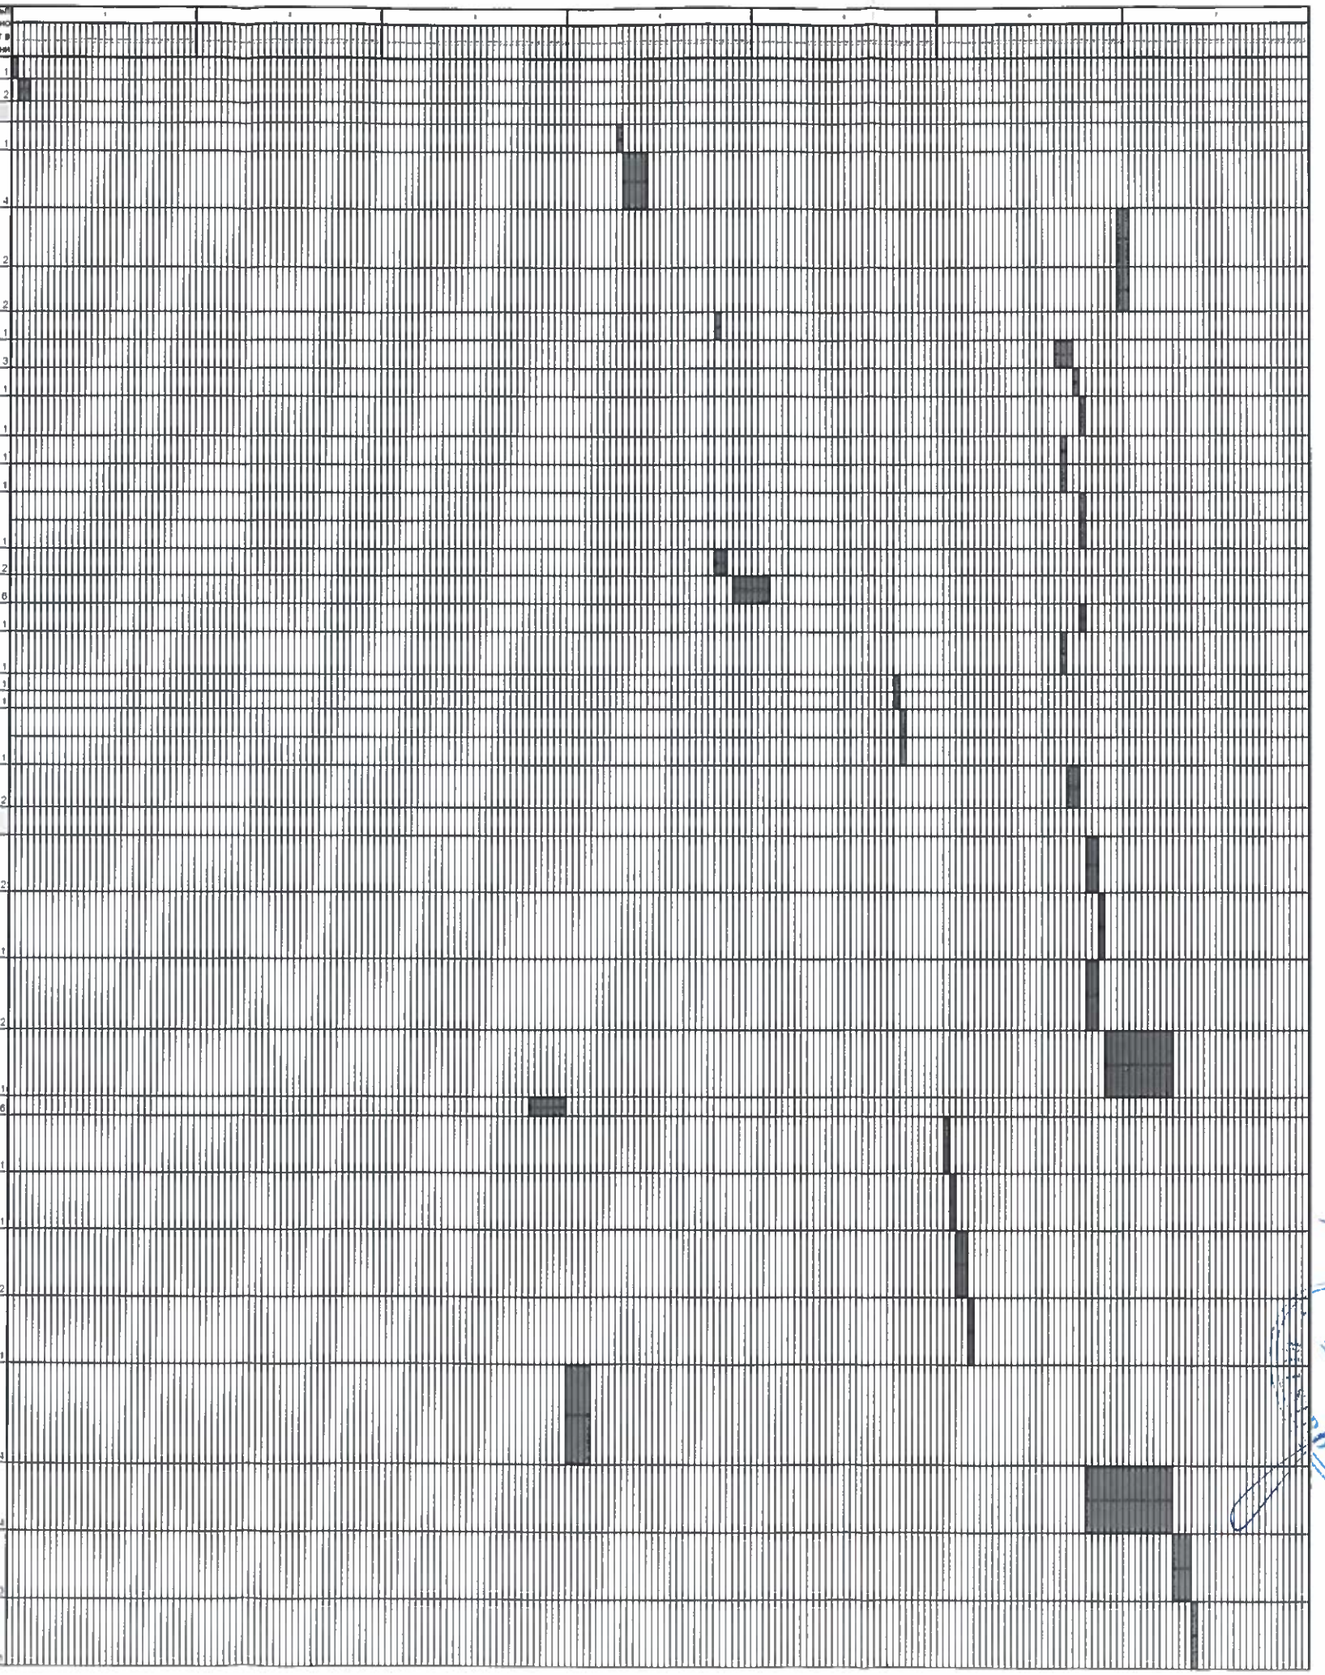

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП
