

Interreg 

Balkan-Mediterranean

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
AIRTHINGS
№ 33



European Union
European Regional
Development Fund

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

COA19-ДГ55-552/04.08.2019

СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № COA19-ДГ55-203/27.03.2019г.,

Днес, 04.08 2019 год., в гр. София, ул. „Московска” № 33, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. „Московска” №33, БУЛСТАТ №000696327, представлявана от заместник-кмета на Столична община **Йоана Владимирова Христова**, възложител съгласно Заповед № COA18-РД09-1409/06.12.2018 г. на кмета на Столична община, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и от друга страна

„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“, ЕИК 130545438, със седалище и адрес на управление Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1766, район Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София №6, Бизнес Център Ричхил, бл. Блок Б, ет. 2, тел: 02/ 970 40 40, e-mail: sales@telelink.com, представлявано от Иван Красимиров Житиянов, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

В изпълнение на Възлагателно писмо № COA19-ТД26-9497(1)/23.07.2019г., предвид възникнали непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на договора и с оглед удължаване времето за изпълнение на проект Ефективно използване на нови технологии за чист атмосферен въздух (AIRTHINGS), Fostering resource efficiency and climate change resilience through community based Air Quality Internet of Things“, основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.20а от ЗЗД, страните по Договора подписаха настоящото

СПОРАЗУМЕНИЕ:

за следното:

Чл. 1 Чл. 3, ал. 1 от Договора се променя, както следва: „Срокът за изпълнение на поръчката, считано от датата на регистрационния индекс на договора е 9 (девет) месеца, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като дейностите по чл. 2, точки от 1 до 5 трябва да бъдат изпълнени не по-късно от 27.12.2019 г. Междинните срокове за изпълнение на всяка дейност се определят според изготвения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** подробен график.

Всички останали разпоредби на Договора, доколкото не противоречат на уговореното в настоящото споразумение, остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор СОА19-ДГ55-203/27.03.2019г.,

Приложение:

- Възлагателно писмо № СОА19-ТД26-9497(1)/23.07.2019г.

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
<p>ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: <i>/ Йоана Христова /</i> съгласно Заповед № СОА18-РД09-1409/06.12.2018 г. на кмета на СО.</p> <p>ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СО: (С. Гекова)</p>	<p>„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“</p> <p><i>/ Иван Житиянов /</i></p> 

За зам.-кмет ч-в ОБСЗ *Ми. Софандъ*
Заповед за заместване №
СОА 19 РД15- 8 5 9 2 / 2 6. 07. 19

А. Петров

Столична община
Исходящ №
СОА19-ТД26-9497-[1]
Регистриран на 23.07.2019
За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



[Signature]
24.07.19

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска" № 33, телефон: 029377302, факс: 029810653, www.sofia.bg

ДО
Г-Н ЦВЕТАН СТОЕВСКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“

На наш № СОА19-ТД26-9497/16.07.2019г.

ОТНОСНО: *Необходимост от изменение на договор №СОА19-ДГ55-203/27.03.2019г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕВСКИ,

В изпълнение на проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ – AIRTHINGS, финансиран по договор за БФП № ВМР1/2.2/2169/2017 по Програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“ е сключен договор № СОА19-ДГ55-203/27.03.2019г. между Столична община и „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД с предмет: „Проектиране, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на пилотна система за следене на атмосферния въздух на територията на СО“.


В хода на изпълнение на договорените дейности възникнаха допълнителни непредвидени обстоятелства, които водят до забавяне и са извън контрола на Изпълнителя, както следва:

1. По време на огледите на място на определените локации за монтаж на сензорните станции се установи необходимост от промяна на същите и допълнително съгласуване на част от предварително зададените конкретни локации/позиции, поради обективна невъзможност за извършване на монтажни дейности, неподходяща околна среда и/или други пречки, възпрепятстващи нормалната функционалност на оборудването. Промяната в локациите/позициите от своя страна налага включване на трети страни в комуникацията, съгласуване и преговори с тях, както и допълнителни дейности, изискващи технологично време (например: реорганизация на движението по пътищата, осигуряване на алтернативно електрозахранване, изработка и доставка на специфични стойки за монтаж и пр.).

Гореописаните обстоятелства са извън контрола на Изпълнителя и не по негова или на Възложителя вина, действие или бездействие, във връзка с което е входирано писмо № СОА19-ТД26-9497/16.07.2019г. с искане за изменение на чл.3 (1) от договора, променяйки срокът за изпълнение на дейностите от т.1 до т.5 по чл.2, като същият се приравни на основния срок за изпълнение на договора – девет месеца от подписването му, или крайният срок да бъде 27.12.2019г.

2. В допълнение е констатирано и забавяне, поради административни и бюрократични причини и във всички останали партньорски градове, част от проекта. Дейностите за доставка и инсталация на сензорните станции в Скопие, Солун, Тирана и Никозия още не са започнали, даже някои партньори още не са провели необходимите процедури за сключване на договори за доставка и монтаж, което доведе до подаване на официално искане за удължаване на срока

Писмото се издава в 1 (един) оригинален екземпляр и не носи хартиен носител за адресата. Писмото съдържа приложения в електронен файл „МА Approval of 2nd Project Modification Request.pdf“ и „Писмо № СОА19-ТД26-9497/16.07.2019г.“. Писмото се изпраща чрез АИССО/СЕОС.

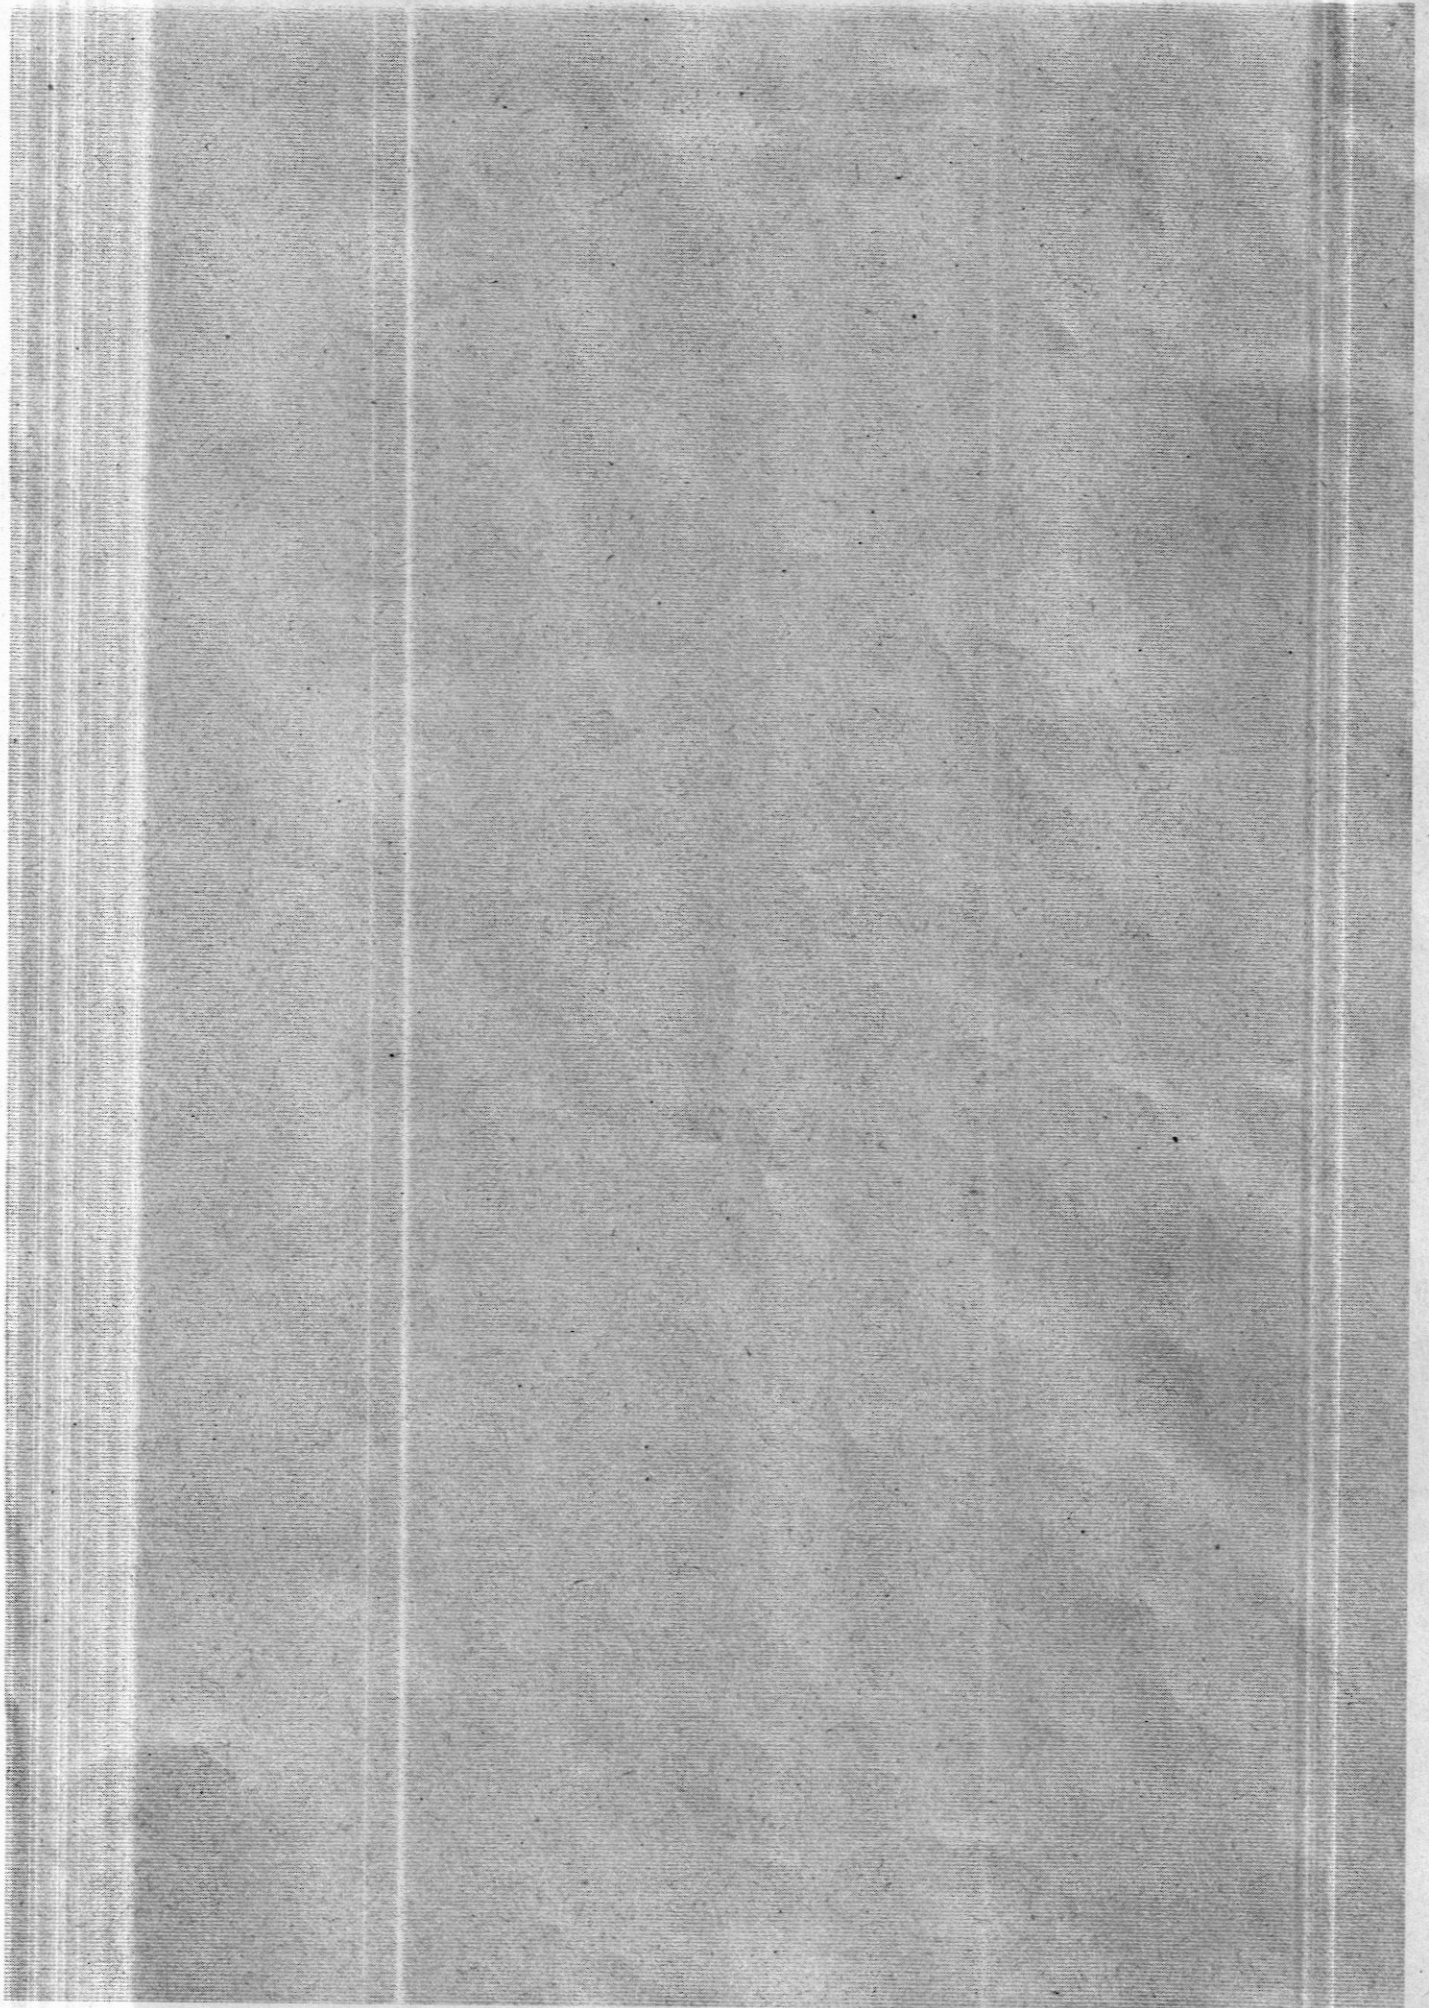

за изпълнение на проекта от страна на Столична община, като водещ партньор. Управляващият орган на програма „Балкани-Средиземно море“ одобри удължаване на срока на проекта с още 9 месеца като новия краен срок за изпълнение на проекта е 14.07.2020г. Уведомлението е получено на 10.07.2019г. по електронната поща.


Това удължаване на срока за изпълнение на проекта дава възможност на останалите партньори да доставят и монтират сензорите си в срока на проекта, но следва да се има предвид, че всички 100 сензора в 5 държави трябва да се свържат към платформата за отворени данни, част от горещитирания договор и да започнат да подават данни към нея за да може да се приеме изпълнението на договора в цялост. Предвид горните обективни обстоятелства, които Столична община, като Възложител не е могла да предвиди, възниква необходимост от изменение на договор №СОА19-ДГ55-203/27.03.2019г., което не води до промяна в предмета на договора, а в срока му за изпълнение, както следва:

В чл. 3, ал. 1 от договора, срокът за изпълнение на дейностите от т.1 до т.5 по чл.2 следва да бъде променен от 01.09.2019г. на 27.12.2019г., като основния срок за изпълнение на договора – девет месеца от подписването му остава непроменен.

Във връзка с гореизложените мотиви, моля да процедурате допълнително споразумение към горещитирания договор, сключен между Столична община и „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД.

Приложения:

1. Писмо № СОА19-ТД26-9497/16.07.2019г.
2. Уведомление от УО на програма „Балкани-Средиземно море“ за одобрено искане за удължаване на срока на проекта.



Съгласувано с:

Директор на дирекция КЕВ – Теодора Полимерова

Изготвил:

Началник отдел „Климат и енергия“ – Антония Новакова

Писмото се издава в 1 (един) оригинален екземпляр и не носи хартиен носител за адресата. Писмото съдържа приложения в електронен файл „MA Approval of 2nd Project Modification Request.pdf“ и „Писмо№ СОА19-ТД26-9497/16.07.2019г.“. Писмото се изпраща чрез АИССО/СЕОС.

